

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 9 месяцев 2026 года**


АО "Шымыз Жылу". Вид деятельности: Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией. Инвестиционная программа на 2026-2030 годы утверждена Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО от 30 декабря 2025 года №257-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 30 декабря 2025 года №67.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

р/с №	Оперативная информация о реализации инвестиционной программы за 9 месяцев 2026 г. в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
	Ис-шаратар атауы	Единиц а измере ния	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства		Бюджетные средства		Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам	
			план	факт	план на год	факт за 9 месяцев	план на год	факт за 9 месяцев	отклонение от плана на год	причины отклонения	план на год	факт за 9 месяцев	план на год	факт за 9 месяцев	план на год	факт за 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего				2 908 597,16	628 133,70	1 798 695,82	628 133,70	-1 170 562,12		1 109 901,34	0	0	0	0	0
	в т.ч.															
1	Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них	м.к. работа услуга	7309 2 1	836	1 645 376,66	75 203,83	535 475,32	75 203,83	-460 271,49	Исполнение мероприятий согласно графиков работ и плана госзакупок. По отдельным мероприятиям планируется корректировка	1 109 901,34					
2	Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов	работа шт	4 6	1	737 191,20	439 545,27	737 191,20	439 545,27	-297 645,93							
3	Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности	работа	1	1	95 502,46	13 312,03	95 502,46	13 312,03	-82 190,43							
4	Ремонт электроснабжения производственных объектов	работа шт	4 2	1	378 619,52	85 876,40	378 619,52	85 876,40	-292 743,13							
5	Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования	шт	19	7	51 907,31	14 196,17	51 907,31	14 196,17	-37 711,15							
	Мероприятия ИП на период с 01.02.2025г. по 31.01.2026г., сроки исполнения которых перенесены на следующий календарный год	работа шт	3 9	1 9	127 480,15	81 563,84	127 480,15	81 563,84	-45 916,31							

Капитальные ремонты тепловых сетей

Ремонт участка тепловой сети от ТК-532 до ТУУ пр.Н.Назарбаева 25/1,27,27/1

В рамках данного ремонта произведена замена участка тепловой сети диаметрами 76, 89, 108, 159 мм и протяженностью 0,258 км канала

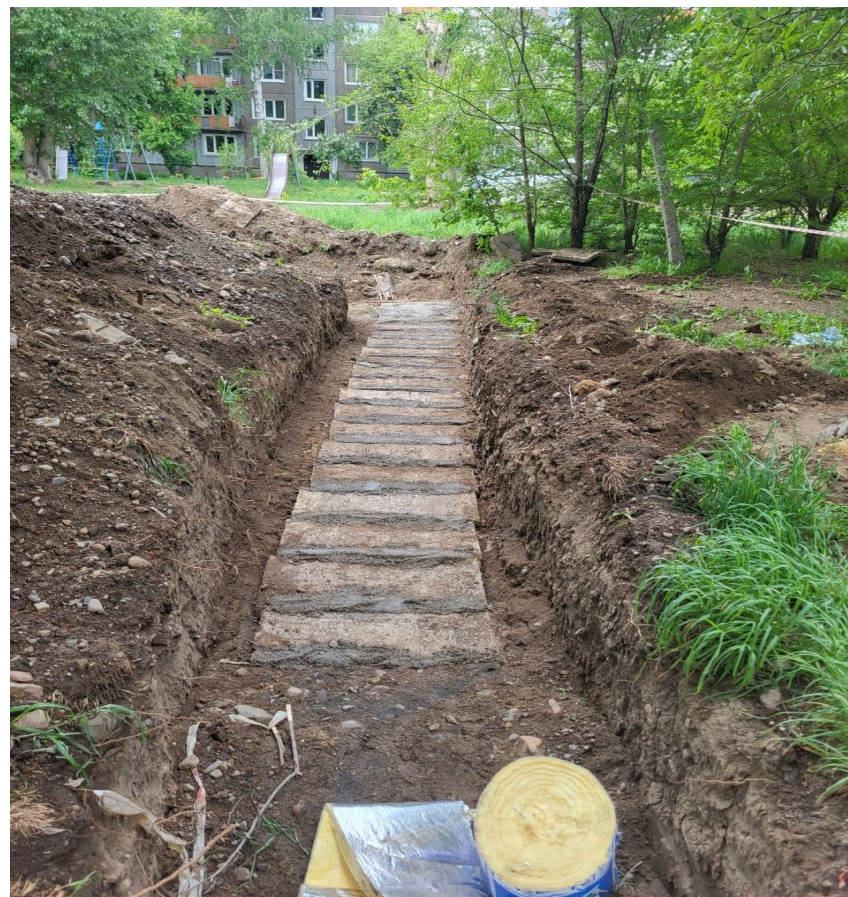

Ремонт участка тепловой сети от ТК-824/1 до ТУУ пр.Назарбаева 79/3, 83/2, 83/3

В рамках данного ремонта произведена замена участка тепловой сети диаметрами 76, 89, 108 мм и протяженностью 0,366 км канала





Ремонт участка тепловой сети от ТК-662/41 до ТК-662/42 и Казахстан 27, 3



В рамках данного ремонта произведена замена участка тепловой сети диаметрами 57, 108, 159, 219 мм и протяженностью 0,211 км канала



Ремонт оборудования котлоагрегата КВТС-50 ст. №1 котельной №2

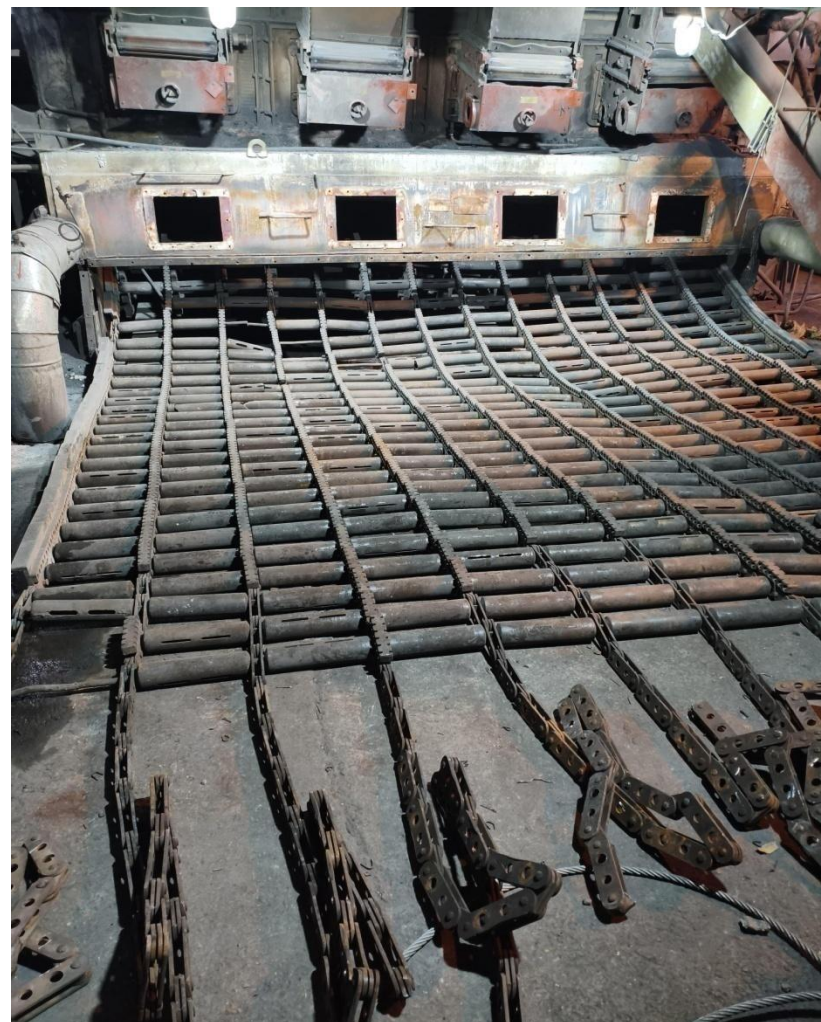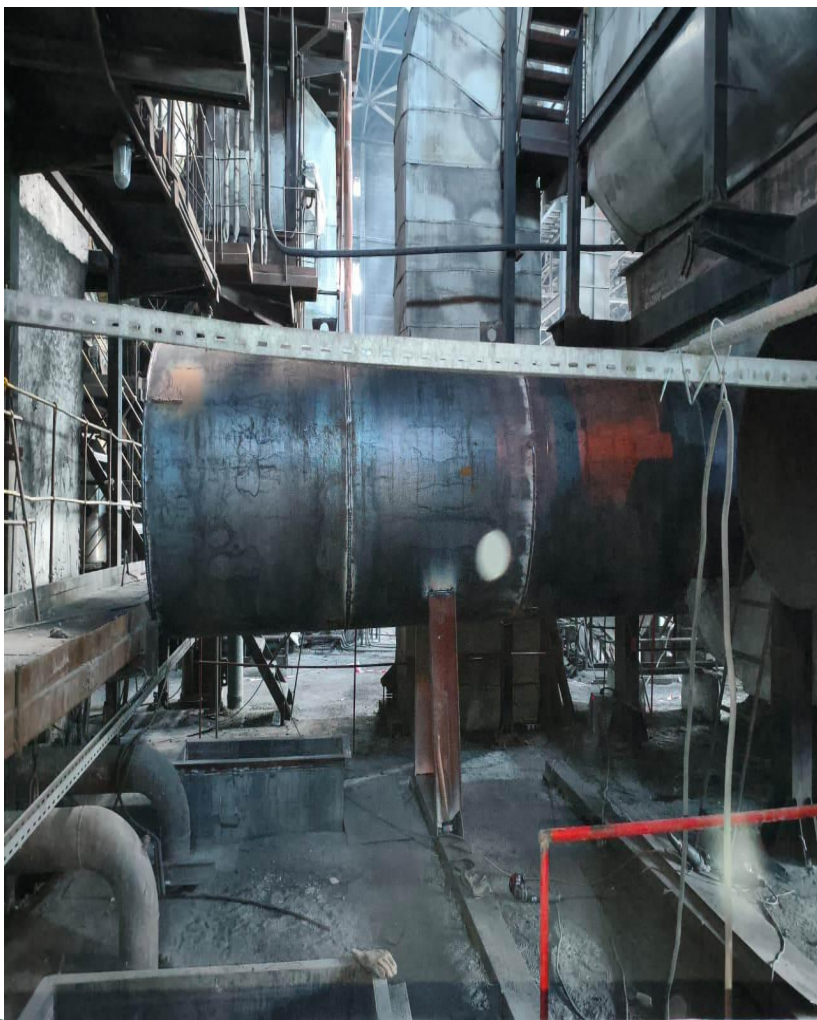

Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-40/14 стационарный №4

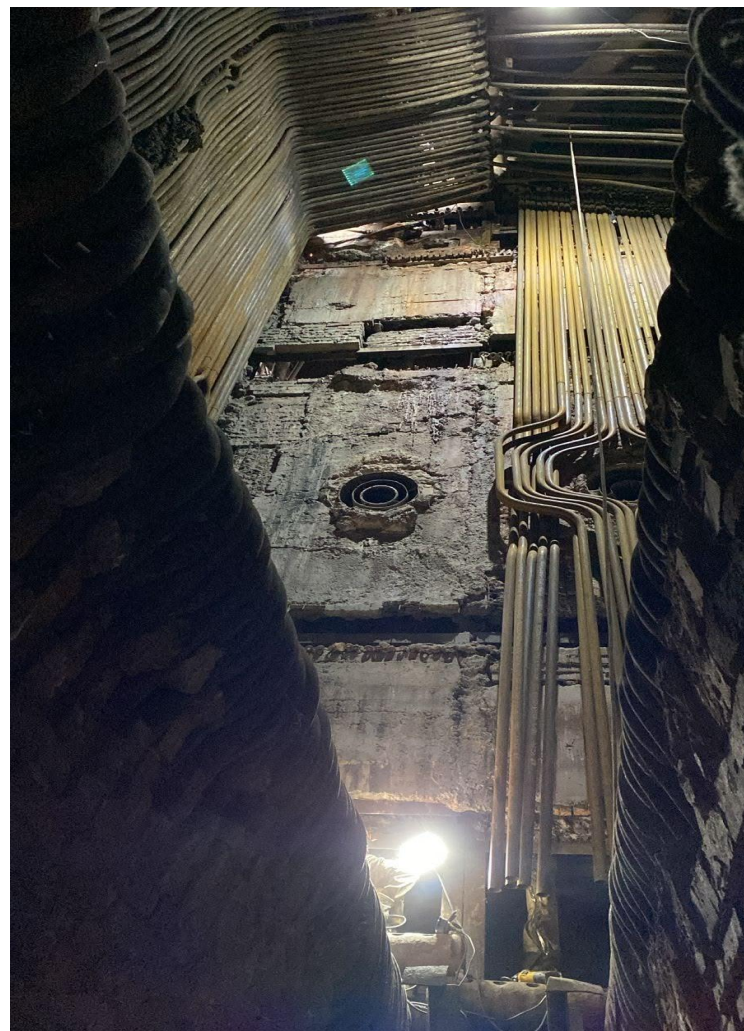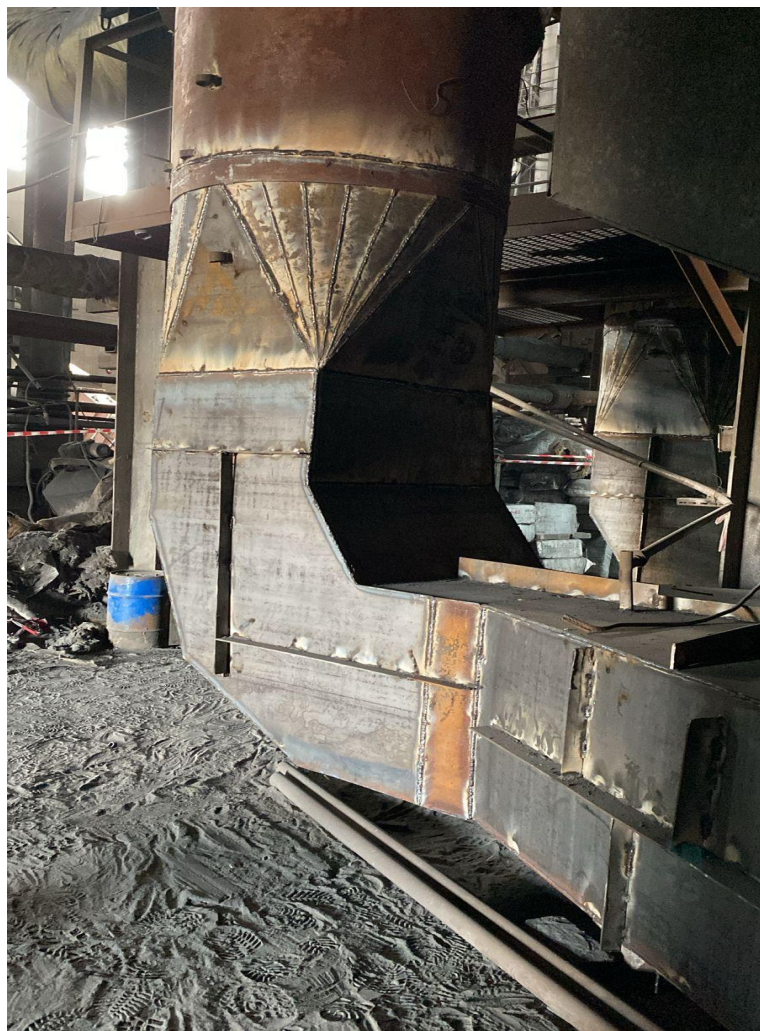

Ремонт оборудования сетевой установки котельной № 2



Техническое перевооружение котельной № 5, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Ново-Ахмирово



Техническое перевооружение котельной № 5, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Ново-Ахмирово



Реконструкция здания ЦТП, по ул. Геологическая 1/9, г. Усть-Каменогорск, ВКО



Строительство сетей электроснабжения с модернизацией системы управления и диспетчеризации ПНС пос. Радужный г. Усть-Каменогорск



ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ХСМГ ХС936



ТЕПЛОЧИСЛИТЕЛЬ ТВ7-01С, 9шт.



МАРШРУТИЗАТОР ВЕРХНЕГО КЛАССА, 5шт.

